

구청장 공약사항 관리카드

(2021. 6. 30. 現在)

공약제목	소규모 주차장 건설			관리번호	4-3-3
주관부서	교통행정과	팀 장	행정6급 양금란(☎4513)	관련부서	
		담당자	행정7급 김 민(☎4514)		
사업기간	2018 ~ [입기 후 계속]		소요예산	14,370백만원(국6,700 시2,520 구5,150)	
추진상황	(완료 · 추진중 · 미착수)	진 도	100% (=실적/추진과제)		
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주택가 밀집지역 주차난 해소 ○ 문화관광 기반시설 운영에 따른 주차장 설치 운영 				
추진과제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 주차장 건설 <ul style="list-style-type: none"> - 4개소(선동, 서동미로시장, 금샘, 오륜동) 				

1. 추진개요

- 선동주차장 건설
 - 위 치 : 선동 720-2번지
 - 규 모 : A=2,465㎡, 지평식 52면
 - 사 업 비 : 1,970백만원(국 500, 시 0, 구 1,470)
 - 공사기간 : 2019. 5. ~ 2019. 9. 26. 준공
- 서동미로시장공영주차장 건설
 - 위 치 : 서동 190-9번지 일원
 - 규 모 : A=3,679㎡, 2층 3단, 145면
 - 사 업 비 : 8,800백만원(국 4,400, 시 1,800, 구 2,600)
 - 공사기간 : 2019. 7. ~ 2020. 5.
- 금샘공영주차장 건설
 - 위 치 : 부곡동 200-103번지 일원
 - 규 모 : A=3,047㎡, 지하2층.3층, 74면
 - 사 업 비 : 3,600백만원(국 1,800, 시 720, 구 1,080)
 - 공사기간 : 2019. 11. ~ 2021. 7.
- 오륜동주차장 건설
 - 위 치 : 오륜동 672-15번지 일원
 - 규 모 : A=1,612㎡, 지평식 47면
 - 사 업 비 : 1,230백만원(국 600, 시 252, 구 378)
 - 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 4.

2. 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
소요 예산 (계획)	소계	14,370	1,170	8,990	2,910	1,300	-	-
	국비	6,700	-	4,400	1,810	490	-	-
	시비	2,520	-	1,800	300	420	-	-
	구비	5,150	1,170	2,790	800	390	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-
투입 예산	소계	13,371	1,170	4,894	3,867	3,440	-	-
	국비	6,325	-	4,400	725	1,200	-	-
	시비	2,169	-	21	1,110	1,038	-	-
	구비	4,877	1,170	473	2,032	1,202	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

3. 추진실적

- 2019. 2.: 서동미로시장공영주차장 도시계획사업 실시계획 고시
- 2019. 3.: 서동미로시장공영주차장 보상협의 완료(10가구 15필지) 선동주차장 주민설명회 개최
- 2019. 4.: 서동미로시장공영주차장 주민설명회 개최
- 2019. 5.: 서동미로시장공영주차장 설계용역 준공, 계약심사(市) 선동주차장 설계용역 준공
선동주차장 건설,전기,통신공사 착공, 폐기물 용역
- 2019. 7.: 서동미로시장 공영주차장 건설,전기,소방,통신공사 착공
서동미로시장 공영주차장 폐기물, 소방감리용역 착공
- 2019. 9.: 선동주차장 공사 준공 ('19.9.26) - 운영개시 ('19.9.28)
- 2019.11.: 금샘 공영주차장 공사 착공
- 2020. 1.: 오륜동 주차장 실시설계용역 착수
- 2020. 3.: 오륜동 주차장 도시계획사업 실시계획 고시
- 2020. 5. : 서동미로시장 공영주차장 공사 준공
- 2020. 6. : 서동미로시장 공영주차장 시범운영 및 주차수요 조사
- 2020. 7. : 서동미로시장 공영주차장 민간위탁 체결 및 주차장 운영
- 2020. 9. : 오륜동 주차장 수용재결 결과 회신
- 2020.10. : 오륜동 주차장 수용재결 보상금 지급
- 2020.11. : 오륜동 주차장 착공
- 2021. 4. : 오륜동 주차장 준공

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

5. 향후계획

- 2021. 7. : 금샘 공영주차장 준공 예정

6. 기타 참고사항(관련사진 등)



선동주차장 위치도



선동주차장 현장사진('19.9.26. 준공)



서동미로시장 공영주차장 위치도



서동미로시장 공영주차장('20.5.20. 준공)




오륜동 주차장 위치도



오륜동 주차장 현장사진('21.4. 준공)



금샘 공영주차장 위치도

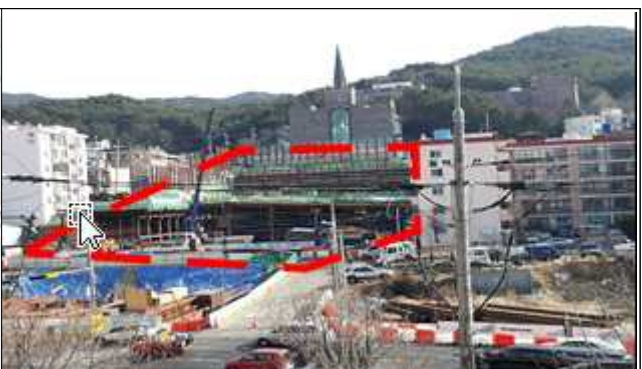

금샘 공영주차장 현장사진('21.7월 준공예정)
