

구청장 공약사항 관리카드

(2021. 12. 31. 現在)

공약제목	황산도 옛길 특화 콘텐츠 개발			관리번호	4-1-2
주관부서	문화관광과	담 당	문화예술팀장 허은숙(☎4063)	관련부서	-
		담당자	행정6급 조지원(☎4064)		
사업기간	2018 ~ 2022년 【임기 내 완료】		소요예산	778백만원(시 600 구 178)	
추진상황	(완료·추진중·미착수)		진 도	100% (=실적/추진과제)	
공약목표	○ 금정구 옛길 황산도를 문화·교육·관광자원으로 활용하여 힐링과 관광이 함께하는 테마형 보행길 조성				
추진과제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학술대회 및 황산도 걷기대회 ○ 관광테마거리 마스터플랜 용역 ○ 하드웨어 및 소프트웨어 구축 관광사업 ○ 역사 테마거리 조성 ○ “길” 문화 메카 조성 				

1. 추진개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 778백만원
- 사업내용 : 실시설계용역, 황산도 거리 정비, 관광콘텐츠 개발 등

2. 투자계획(비예산)

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
소요 예산 (계획)	소계	778	-	8	20	750	-	-	-
	국비	0	-	-	-	-	-	-	-
	시비	600	-	-	-	600	-	-	-
	구비	178	-	8	20	150	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
투입 예산	소계	778	-	8	20	55.8	694.2	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	600	-	-	-	44.7	555.3	-	-
	구비	178	-	8	20	11.1	138.9	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 추진실적

- 학술대회 개최 : 2018. 12. 6.
- 황산도 걷기 답사 : 2018. 12. 8.
- 「옛길 원천콘텐츠 개발 및 스토리텔링 구축」 용역 추진 : 2019. 3. ~ 9.
- 우리고장 바로 알기 체험 「황산도 걷기 답사」 : 2019. 9. ~ 12.
- 부산시 2020년 탐방로 안내체계 구축「테마거리 조성」 분야 공모 선정 : 2020. 4. 21.
- 우수사례 벤치마킹, 유관기관 방문(문경, 대구, 양산시) : 2020. 6. ~ 7.
- (舊)선동작업장 공유재산 관리관 변경(생활보장과→문화관광과) : 2020. 7. 6.
- 황산도 옛길 테마거리 조성사업 실시설계 용역 착수 : 2020. 8. 7.
- (舊)선동작업장 경계복원 측량 : 2020. 9. 10.
- 황산도 옛길 테마거리 조성사업 주민 설명회 개최 : 2020. 9. 15.
- (舊)선동작업장 내 석면 해체 및 제거 : 2020. 12. 28.
- 황산도 옛길 테마거리 조성사업 실시설계 용역 준공 : 2021. 3. 7.
- 분야별 공사계약 심사 : 2021. 3. ~ 4.
- 공사 착공(건축, 전기, 토목, 정보통신, 시설물) : 2021. 4.
- 공사 준공(건축, 정보통신) : 2021. 7.
- 공사 준공(전기) : 2021. 8.
- 공사 준공(토목, 시설물) : 2021. 9.
- 황산도 금정쉼터 개소 : 2021. 10. 7.

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 해당없음

5. 향후계획

- 황산도 금정쉼터 운영 및 테마거리 활용 프로그램 운영

6. 기타 참고사항(관련사진 등)


○ 위치도 및 현장사진



황산도 금정장원길(위치도)



황산도 금정쉼터(현장사진)

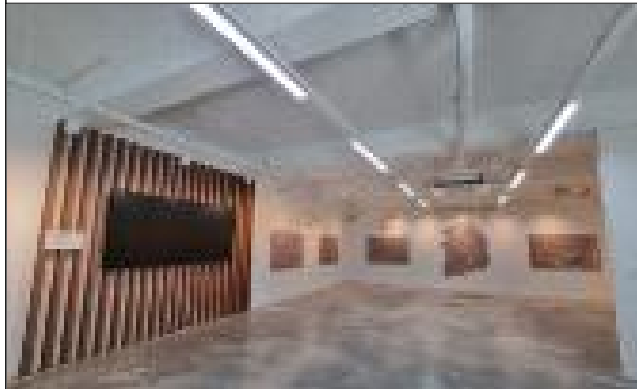

황산도 금정쉼터 내부(1층)



황산도 금정쉼터 내부(2층)
