

# 구청장 공약사항 관리카드

(2021. 12. 31. 現在)

공약제목	<b>소규모 주차장 건설</b>			관리번호	4-3-3
주관부서	교통행정과	팀 장	행정6급 김미경(☎4513)	관련부서	-
		담당자	행정7급 김대동(☎4514)		
사업기간	2018 ~ <b>[임기 후 계속]</b>		소요예산	15,600백만원(국7,300 시2,772 구5,528)	
추진상황	(완료 · 추진중 · 미착수)	진 도	100% (=실적/추진과제)		
공약목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주택가 밀집지역 주차난 해소</li> <li>○ 문화관광 기반시설 운영에 따른 주차장 설치 운영</li> </ul>				
추진과제	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소규모 주차장 건설                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4개소(선동, 서동미로시장, 오륜동, 금샘)</li> </ul> </li> </ul>				

## 1. 추진개요

- 선동주차장 건설
  - 위 치 : 선동 720-2번지
  - 규 모 : A=2,465㎡, 지평식 52면
  - 사 업 비 : 1,970백만원(국 500, 시 0, 구 1,470)
  - 공사기간 : 2019. 5. ~ 2019. 9.
- 서동미로시장공영주차장 건설
  - 위 치 : 서동 190-9번지 일원
  - 규 모 : A=3,679㎡, 2층 3단, 145면
  - 사 업 비 : 8,800백만원(국 4,400, 시 1,800, 구 2,600)
  - 공사기간 : 2019. 7. ~ 2020. 5.
- 오륜동주차장 건설
  - 위 치 : 오륜동 672-15번지 일원
  - 규 모 : A=1,612㎡, 지평식 47면
  - 사 업 비 : 1,230백만원(국 600, 시 252, 구 378)
  - 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 4.
- 금샘공영주차장 건설
  - 위 치 : 부곡동 200-103번지 일원
  - 규 모 : A=3,047㎡, 지하2층.3층, 75면
  - 사 업 비 : 3,600백만원(국 1,800, 시 720, 구 1,080)
  - 공사기간 : 2019. 11. ~ 2021. 7.

## 2. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
소요 예산 (계획)	소계	15,600	1,170	8,990	2,910	2,530	-	-
	국비	7,300	-	4,400	1,810	1,090	-	-
	시비	2,772	-	1,800	300	672	-	-
	구비	5,528	1,170	2,790	800	768	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-
투입 예산	소계	15,600	1,170	4,894	3,867	3,527	2,142	-
	국비	7,300	-	4,400	725	1,107	1,068	-
	시비	2,772	-	21	1,110	1,213	428	-
	구비	5,528	1,170	473	2,032	1,207	646	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

## 3. 추진실적

- 2019. 2.: 서동미로시장공영주차장 도시계획사업 실시계획 고시
- 2019. 3.: 서동미로시장공영주차장 보상협의 완료(10가구 15필지)  
선동주차장 주민설명회 개최
- 2019. 4.: 서동미로시장공영주차장 주민설명회 개최
- 2019. 5.: 서동미로시장공영주차장 설계용역 준공, 계약심사(市)  
선동주차장 설계용역 준공  
선동주차장 건설,전기,통신공사 착공, 폐기물 용역
- 2019. 7.: 서동미로시장 공영주차장 건설,전기,소방,통신공사 착공  
서동미로시장 공영주차장 폐기물, 소방감리용역 착공
- 2019. 9.: 선동주차장 공사 준공 ('19.9.26) - 운영개시 ('19.9.28)
- 2020. 1.: 오륜동 주차장 실시설계용역 착수
- 2020. 3.: 오륜동 주차장 도시계획사업 실시계획 고시
- 2020. 5.: 서동미로시장 공영주차장 공사 준공
- 2020. 6.: 서동미로시장 공영주차장 시범운영 및 주차수요 조사
- 2020. 7.: 서동미로시장 공영주차장 민간위탁 체결 및 주차장 운영
- 2020. 9.: 오륜동 주차장 수용재결 결과 회신
- 2020.10.: 오륜동 주차장 수용재결 보상금 지급
- 2021. 4.: 오륜동 주차장 준공
- 2021. 7.: 금샘 공영주차장 준공

**4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)**

○ 해당없음

**5. 향후계획**

○ 주차난 해소를 위해 대상지 발굴 및 주차장 조성 추진

**6. 기타 참고사항(관련사진 등)**



선동주차장 위치도



선동주차장 현장사진('19.9.26. 준공)




서동미로시장 공영주차장 위치도



서동미로시장 공영주차장('20.5.20. 준공)



오륜동 주차장 위치도

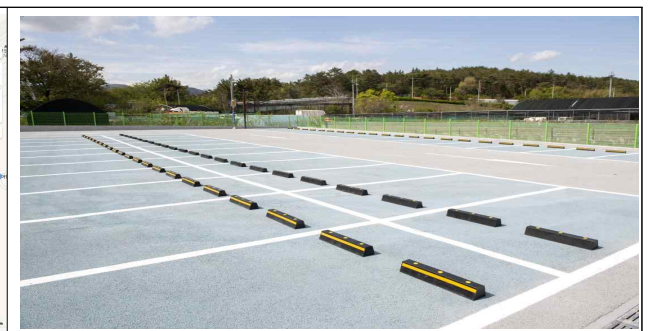

오륜동 주차장 현장사진('21.4.14. 준공)



금섬 공영주차장 위치도



금섬 공영주차장 현장사진('21.8.5. 준공)
