

구청장 공약사항 관리카드

(2021. 12. 31. 現在)

공약제목	등산로·산책로 정비로 부산의 명소 조성			관리번호	4-1-1
주관부서	공원녹지과	담 당	녹지6급 황중대(☎4543)	관련부서	문화관광과, 건설과
		담당자	녹지8급 정혜인(☎4545)		
사업기간	2018 ~ 【임기 후 계속】		소요예산	4,394백만원(국3,287 시1,073 구1,030)	
추진상황	(완료·추진중·미착수)	진 도	100%		
공약목표	○ 편리하게 산을 찾고 즐길 수 있으며, 금정구의 역사·문화 스토리텔링이 함께하는 안전하고 쾌적한 숲길(등산로) 제공				
추진과제	○ 숲길 정비 50km : 데크 2.5km, 등산로 47.5km ○ 이정표 및 편의시설 정비 55개소 : 이정표 30, 편의시설 25				

1. 추진개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 규 모 : 숲길 67개노선 107km(데크 3.1²km)
- 사업내용 : 숲길정비(50km), 편의시설(25개소), 이정표(30개소)

구 분	'18	'19	'20	'21	'22	비고
숲길정비(50km)	4km	10km	12km	12km	12km	
편의시설(25개소)	5개소	5개소	5개소	5개소	5개소	
이 정 표(30개소)	-	10개소	6개소	7개소	7개소	

2. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후	
소요 예산 (계획)	소계	4,394	1,171	158	1,425	350	390	430	470
	국비	2,582	586	64	1,112	175	195	215	235
	시비	1,108	409	45	78	123	137	151	165
	구비	704	176	49	235	52	58	64	70
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
투입 예산	소계	5,447	1,171	158	1,425	1,301	1,392	-	-
	국비	2,662	586	64	1,112	-	900	-	-
	시비	1,597	409	45	78	863	202	-	-
	구비	1,188	176	49	235	438	290	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 추진실적

○ 숲길정비(40km), 편의시설(57개소), 이정표(45개소)

구 분	계	'18	'19	'20.	'21.12.	비 고
숲길정비(km)	40	4	12	12	12	
데크정비	2.8	1.7	0.3	0.4	0.4	
노면정비	37.2	2.3	11.7	11.6	11.6	
편의시설(개소)	56	5	9	19	23	
이 정 표(개소)	47	-	15	17	15	
사업비(백만원)	4,276	158	1,425	1,301	1,392	

○ 2018년도 실적

- ▶ 데크정비(1.7km) : 데크철거(윤산) 1.6km, 교체(범어사상행로) 0.1km
- ▶ 노면정비(2.3km) : 금정산둘레길 2.3km
- ▶ 편의시설(5개소) : 정자(윤산) 1, 의자(윤산) 4

○ 2019년도 실적

- ▶ 데크정비(0.3km) : 데크철거(남문) 0.2km, 교체(고당봉) 0.1km
- ▶ 생태탐방로(2km) : 땅퇴산 1km, 탐방데크 0.2km, 대숲 0.3km, 등산로 0.5km
- ▶ 노면정비(9.9km) : 금정산(고당봉) 7.8km, 윤산 2km, 남문임도 0.1km
- ▶ 편의시설(24개소) : 평상의자(윤산) 9, 이정표(윤산) 5, 안내판(윤산,금정산) 10
- ▶ 금정산성 역사문화탐방로 1차(서문~제4망루) : 노면정비 1.8km

○ 2020년도 실적

- ▶ 데크정비(0.4km) : 교체(고당봉) 0.2km, 철거(대륙봉) 0.1km, (범어사) 0.1km
- ▶ 노면정비(8.5km) : 금정산(둘레길) 3km, 금정산 2km, 윤산 0.5km, 치유숲길 3km
- ▶ 편의시설(14개소) : 먼지털이 3, 평상의자(서동) 3, 의자 8
- ▶ 안내시설(12개소) : 이정표 12
- ▶ 부산종합버스터미널 주변 누리길 : 노면정비(청룡노포동) 0.7km, 평상의자 5
- ▶ 금정산성 역사문화탐방로 2차(남문~동문) : 노면정비 2.4km, 이정표 5

○ 2021년도 실적

- ▶ 데크정비(0.4km) : 교체정비 (범어사 상행로) 0.29km, (목교5개소) 0.11km
- ▶ 노면정비(11.6km) : 금정산 2.5km, 윤산 3.1km, 땅퇴산 1km, 회동호치유숲길 5km
- ▶ 편의시설(23개소) : 먼지털이 1, 벤치 13, 평상 7, 정자 2
- ▶ 안내시설(15개소) : 윤산 안내판 4, 치유숲길 안내판 1, 이정표 10

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 문 제 점 : 데크로드 및 시설물 등 설치 물량 증가함에 따라 이
용안전관리 주의 요함
- 대책방안 : 직영인력 활용한 주기적인 순찰 및 점검을 통한 신속한
정비 실시

5. 향후계획

○ 2022년 : 숲길정비(10km), 편의시설(10개), 안내판(5개)

6. 기타 참고사항(관련사진 등)



2018. 숲길정비(데크교체, 범어사 상행로)



2018. 편의시설(윤산)



2019. 숲길정비(데크철거, 남문 입구)




2019. 편의시설(윤산)



2020. 생태탐방로(회동수원지)



2020. 대숲길(회동수원지)

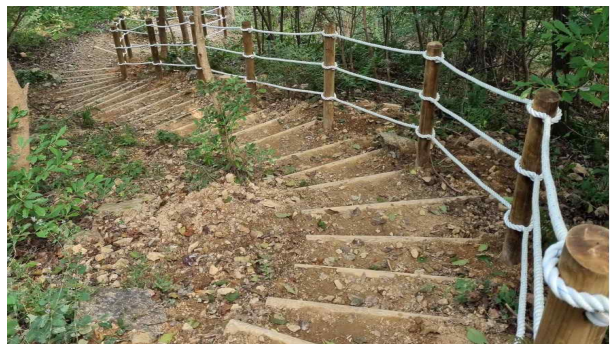

2021. 숲길정비(윤산)



2021. 편의시설(선동)
